

# گزارش عملکرد

(اداره تعمیرات و نگهداری دانشگاه)

از مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ لغایت ۱۴۰۲/۰۸/۰۱


۱- موضوع پروژه: اجرای فنس کشی برای سایت خوابگاه خواهران

مبلغ اولیه قرارداد: ۱/۹۸۳/۹۹۹/۹۲۰ ریال

مبلغ تمام شده قرارداد: ۲/۴۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

تاریخ شروع: ۱۴۰۲/۰۶/۰۵

تاریخ پایان: ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

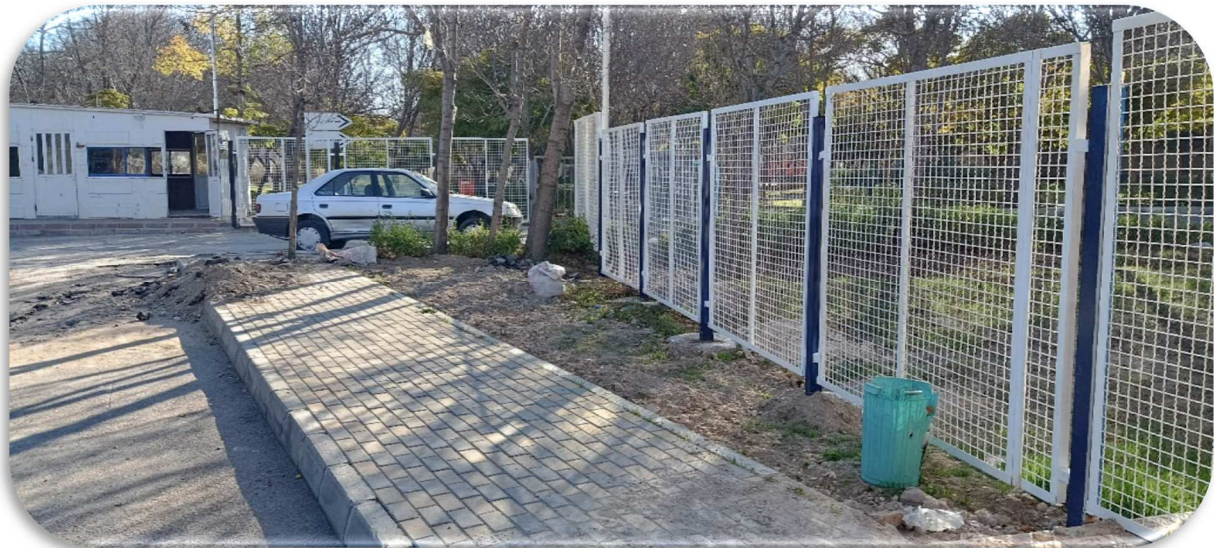


۲- موضوع پروژه: پارتیشن بندی در ساختمان خوابگاه های دانشجویی خواهران

مبلغ اولیه قرارداد: ۲/۱۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

مبلغ تمام شده قرارداد: ۲/۷۳۰/۷۵۰/۰۰۰ ریال

تاریخ شروع: ۱۴۰۲/۰۶/۰۵

تاریخ پایان: ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

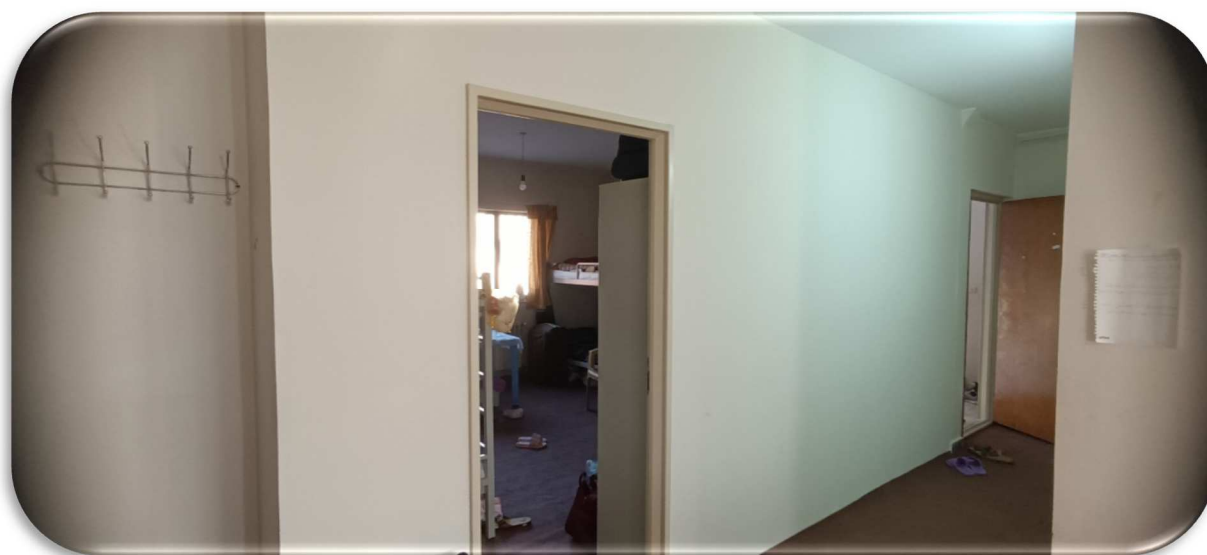

۳- موضوع پروژه: عملیات ساختمان موتورخانه غذاخوری دانشگاه محقق اردبیلی

مبلغ اولیه قرارداد: ۸/۶۶۰/۰۴۲/۱۲۴ ریال

مبلغ تمام شده قرارداد: در حال انجام

تاریخ شروع: ۱۴۰۲/۰۴/۲۸

تاریخ پایان: در حال انجام



۴- موضوع پروژه: عملیات تهیه و اجرای پارتیشن بندی و اجرای سرویس بهداشتی خوابگاه ولایت

مبلغ اولیه قرارداد: ۴/۴۳۸/۸۰۰/۰۰۰ ریال

مبلغ تمام شده قرارداد: در حال انجام

تاریخ شروع: ۱۴۰۲/۰۶/۲۰

تاریخ پایان: در حال انجام



۵- موضوع پروژه: عملیات اجرای زیرسازی و آسفالت مسیر دسترسی خوابگاه  
متاهلین

مبلغ اولیه قرارداد: ۱۸/۳۷۷/۷۷۳/۰۸۰ ریال

مبلغ تمام شده قرارداد: در حال انجام

تاریخ شروع: ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

تاریخ پایان: ۱۴۰۲/۰۶/۲۲





۶- موضوع پروژه: تعمیر و بازسازی واحد بین الملل

مبلغ اولیه قرارداد: ۱/۸۱۸/۵۰۰/۰۰۰ ریال

مبلغ تمام شده قرارداد: در حال انجام

تاریخ شروع: ۱۴۰۲/۰۲/۲۳

تاریخ پایان: ۱۴۰۲/۰۴/۰۵

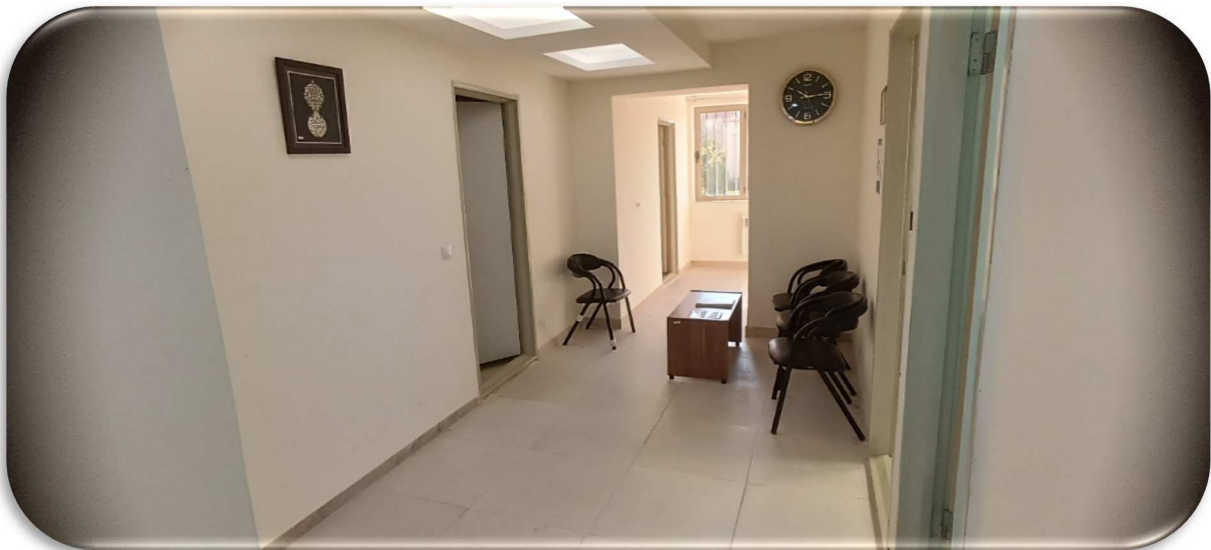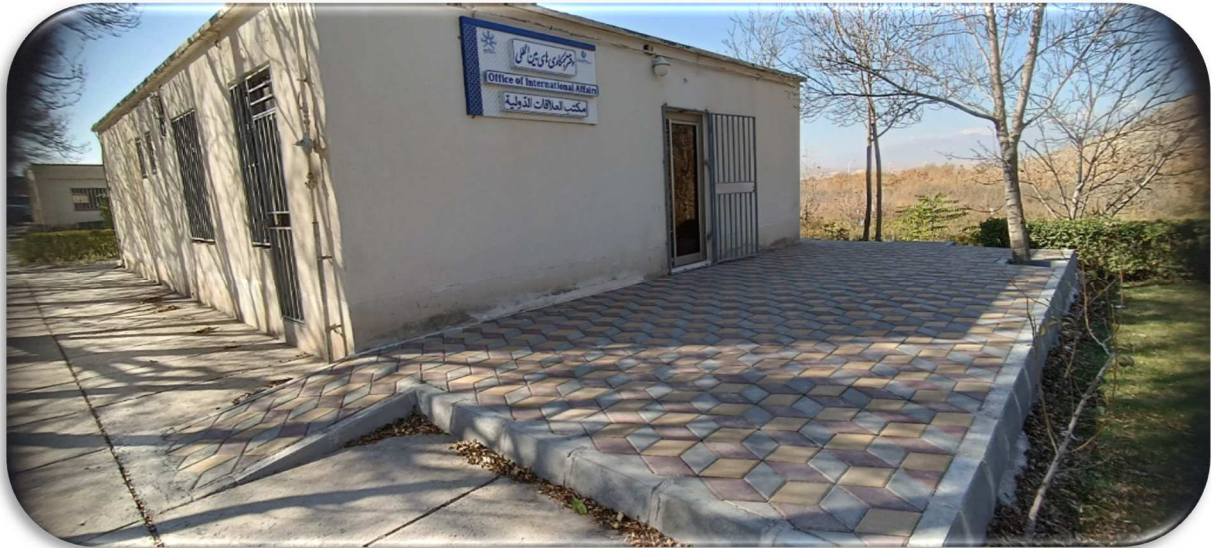


۷- موضوع پروژه: عملیات تبدیل کلاس به آمفی تیاتر دانشکده فنی

مبلغ اولیه قرارداد: ۱/۱۱۹/۹۹۹/۹۶۰ ریال

مبلغ تمام شده قرارداد: در حال انجام

تاریخ شروع: ۱۴۰۱/۱۲/۲۸

تاریخ پایان: ۱۴۰۲/۰۴/۰۵

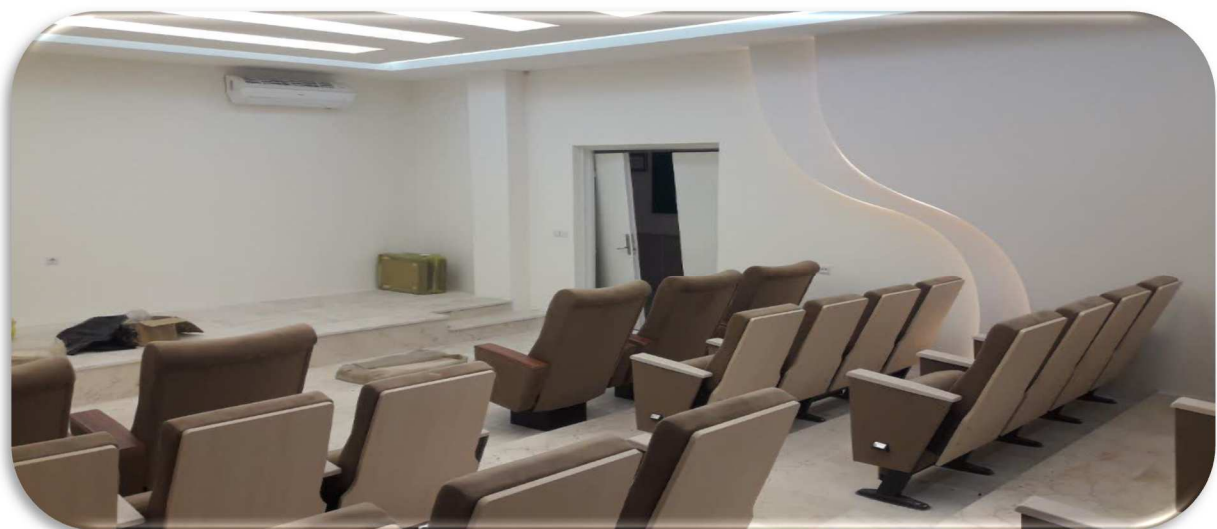




۸- موضوع پروژه: عملیات تهیه و اجرای پازل بتنی مسیر پیاده رو دانشکده علوم  
اجتماعی

مبلغ اولیه قرارداد: ۵۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

مبلغ تمام شده قرارداد: ۶۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

تاریخ شروع: ۱۴۰۲/۰۶/۲۸

تاریخ پایان: ۱۴۰۲/۰۷/۲۸

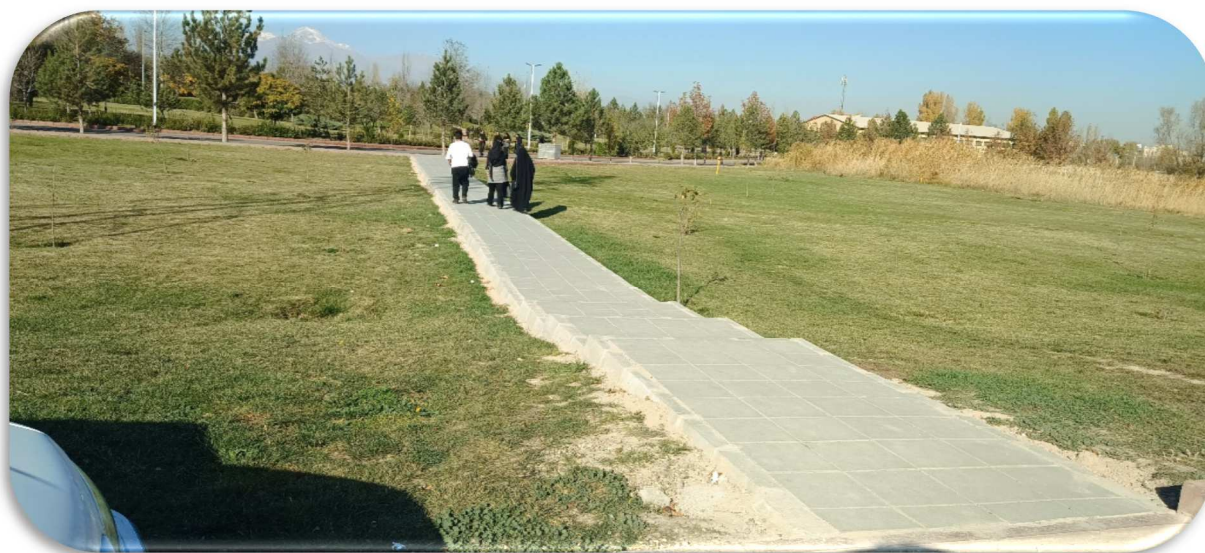


۹- موضوع پروژه: عملیات عایق پشت بام دانشکده علوم انسانی دانشگاه محقق  
اردبیلی

مبلغ اولیه قرارداد: ۹۰۶/۵۰۰/۰۰۰ ریال

مبلغ تمام شده قرارداد: ۹۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

تاریخ شروع: ۱۴۰۲/۰۶/۲۷

تاریخ پایان: ۱۴۰۲/۰۷/۲۷

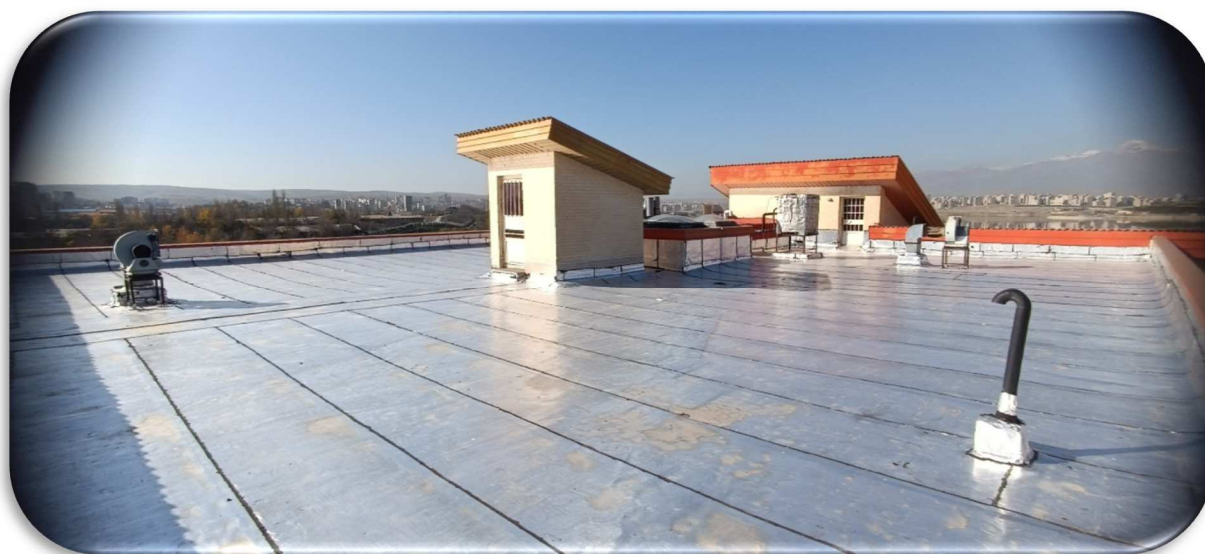

۱۰- موضوع پروژه: عملیات تعمیر و بازسازی سقف کاذب دانشکده معماری

دانشگاه محقق اردبیلی

مبلغ اولیه قرارداد: ۲/۷۴۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال

مبلغ تمام شده قرارداد: در حال انجام

تاریخ شروع: ۱۴۰۲/۰۶/۲۷

تاریخ پایان: ۱۴۰۲/۰۷/۲۷



۱۱- موضوع پروژه: عملیات تعمیر و بازسازی بخشی از تاسیسات مکانیکی

موتورخانه خوابگاه کوثر یک دانشگاه محقق اردبیلی

مبلغ اولیه قرارداد: ۶/۸۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

مبلغ تمام شده قرارداد: در حال انجام

تاریخ شروع: ۱۴۰۱/۰۶/۲۹

تاریخ پایان: ۱۴۰۱/۰۷/۲۷



۱۲- موضوع پروژه: عملیات تعمیر و بازسازی بخشی از ساختمان غذاخوری  
دانشگاه محقق اردبیلی

مبلغ اولیه قرارداد: ۶/۴۵۱/۶۲۱/۰۶۱ ریال

مبلغ تمام شده قرارداد: در حال انجام

تاریخ شروع: ۱۴۰۱/۰۵/۰۱

تاریخ پایان: ۱۴۰۱/۰۸/۰۱



۱۳- موضوع پروژه: عملیات اجرای دیوار با صفحات گچی در ساختمان معاونت  
آموزشی دانشگاه محقق اردبیلی

مبلغ اولیه قرارداد: ۱/۳۲۹/۰۱۴/۰۰۰ ریال

مبلغ تمام شده قرارداد: ۱/۲۲۵/۴۵۰/۷۵۰ ریال

تاریخ شروع: ۱۴۰۱/۱۰/۲۸

تاریخ پایان: ۱۴۰۱/۱۱/۲۷




۱۴- موضوع پروژه: عملیات تعمیر و بازسازی انبار مرکزی دانشگاه محقق اردبیلی

مبلغ اولیه قرارداد: ۸۲۹/۵۱۳/۰۰۰

مبلغ تمام شده قرارداد: در حال رسیدگی

تاریخ شروع: ۱۴۰۱/۱۰/۰۴

تاریخ پایان: ۱۴۰۱/۱۱/۰۴

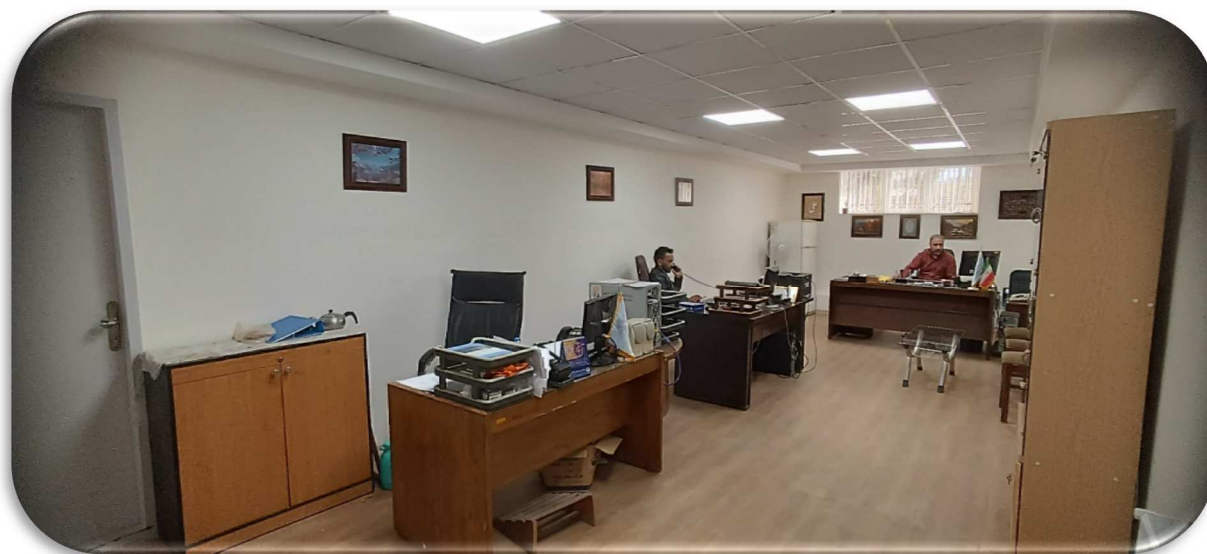


۱۵- موضوع پروژه: عملیات اجرای شوتینگ زباله خوابگاه های دانشجویی  
خواهران دانشگاه محقق اردبیلی

مبلغ اولیه قرارداد: ۱/۰۸۷/۵۰۰/۰۰۰

مبلغ تمام شده قرارداد: در حال رسیدگی

تاریخ شروع: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

تاریخ پایان: ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

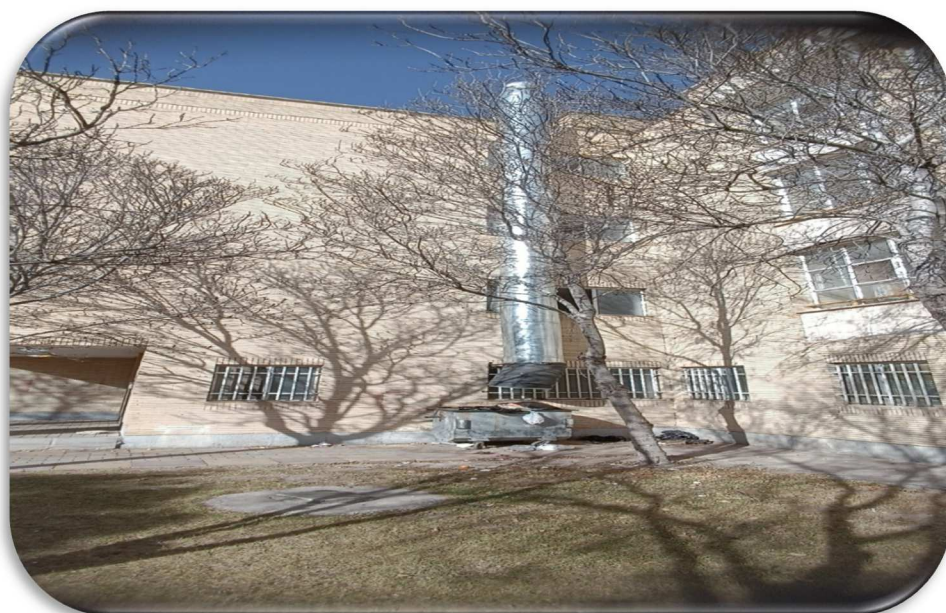




۱۶- موضوع پروژه: عملیات تهیه و اجرای دیوار با صفحات گچی در ساختمان  
خوابگاه دانشجویی دانشکده نمین دانشگاه محقق اردبیلی

مبلغ اولیه قرارداد: ۶۰۶/۰۰۰/۰۰۰

مبلغ تمام شده قرارداد: ۶۷۷/۰۰۰/۰۰۰

تاریخ شروع: ۱۴۰۱/۰۸/۲۳

تاریخ پایان: ۱۴۰۱/۰۹/۲۳

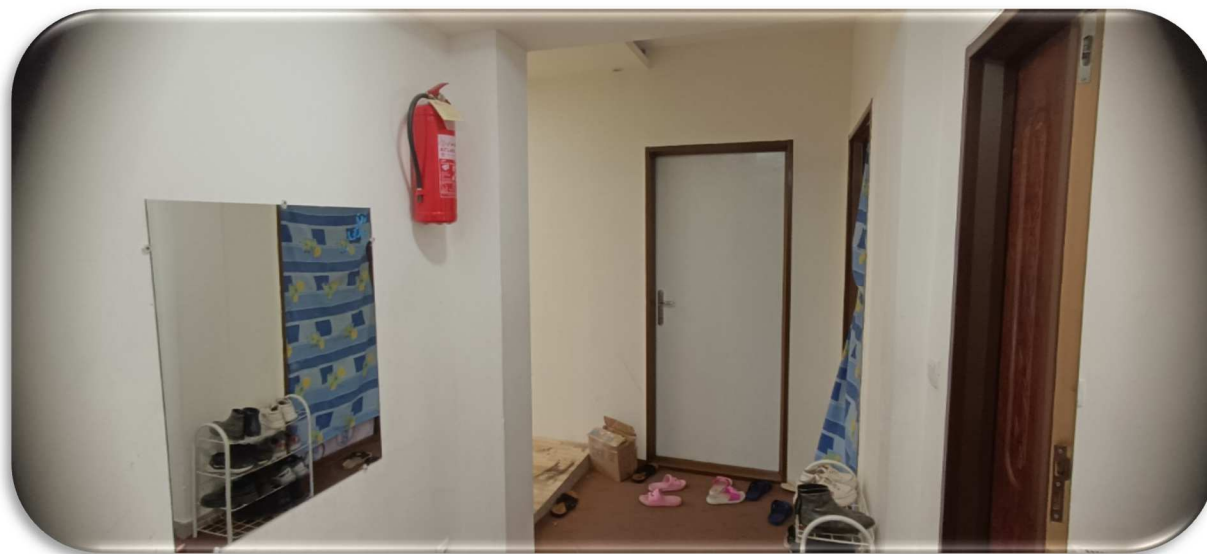

۱۷- موضوع پروژه: عملیات تهیه و اجرای دیوار با صفحات گچی در ساختمان

سبلان دانشگاه محقق اردبیلی

مبلغ اولیه قرارداد: ۶۹۳/۶۰۰/۰۰۰

مبلغ تمام شده قرارداد: ۶۸۲/۶۵۷/۰۰۰

تاریخ شروع: ۱۴۰۱/۰۸/۲۱

تاریخ پایان: ۱۴۰۱/۰۹/۲۱



۱۸- موضوع پروژه: عملیات تهیه و اجرای دیوار با صفحات گچی در ساختمان



سبلان دانشگاه محقق اردبیلی

مبلغ اولیه قرارداد: ۸۵۶/۶۰۰/۰۰۰

مبلغ تمام شده قرارداد: ۱/۰۲۲/۸۵۱/۲۰۰

تاریخ شروع: ۱۴۰۱/۰۸/۲۱

تاریخ پایان: ۱۴۰۱/۰۹/۲۱

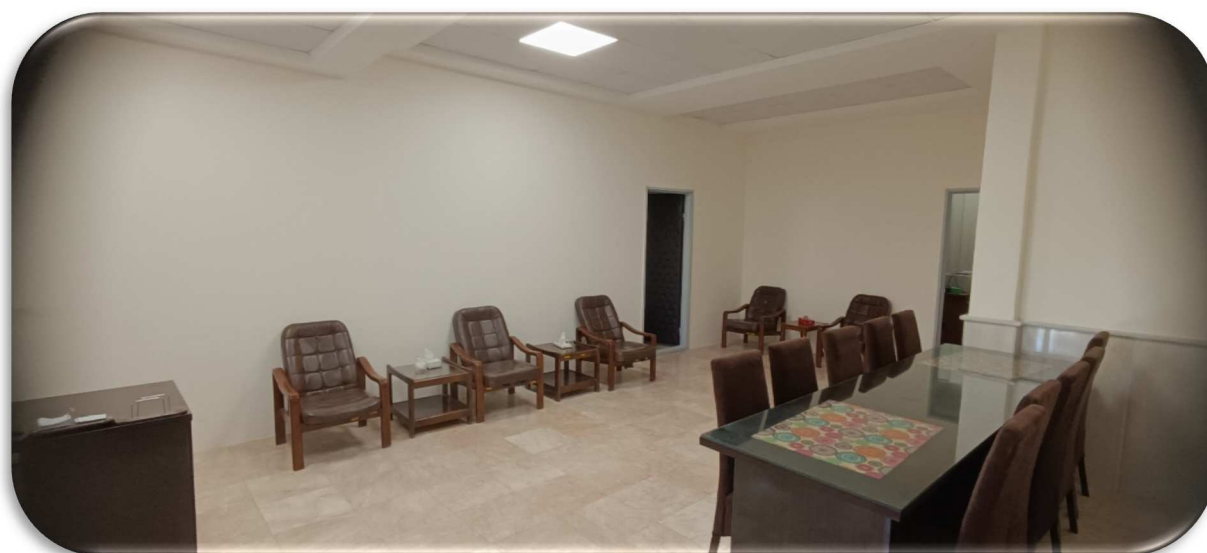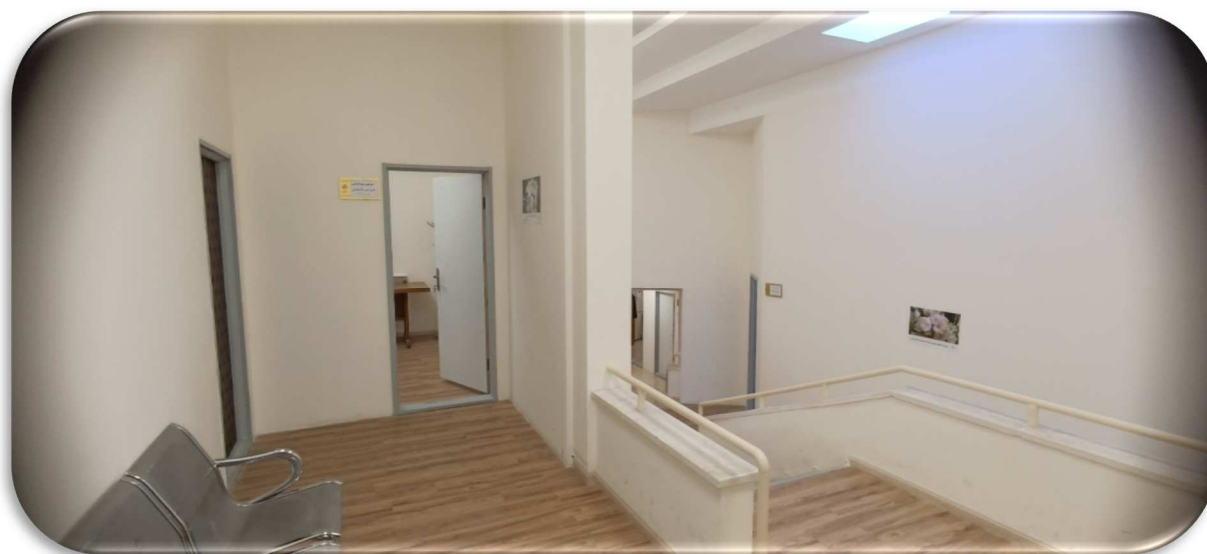

## تعمیرات جزئی تاسیسات ساختمان‌های دانشگاه:

۱- تعمیرات جزئی تاسیسات مکانیکی انجام شده برای تمامی واحدهای دانشگاه:

۱۴۸۸ مورد

۲- تعمیرات جزئی تاسیسات برقی انجام شده برای تمامی واحدهای دانشگاه:

۱۱۰۲ مورد
